

神龙山组团市政工程——神龙西路 等 3 条道路照明工程专业分包施工合同 (此合同除核心条款不变外, 以最终签订版为准)

甲方: 广安交投神龙置业有限公司

乙方:

甲方通过公开询价的方式, 确定乙方为神龙山组团市政工程——神龙西路、横九路、环湖四路(下称“本项目”)照明工程专业分包的施工单位。为明确甲乙双方的权利和义务, 根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定, 现就上述项目照明工程专业分包施工事宜协商一致, 特签订本合同。

一、项目基本情况及施工内容

(一) 项目名称: 神龙山组团市政工程——神龙西路、横九路、环湖四路。

(二) 项目概况

1. 神龙西路: 起点桩号 K0+000, 终点桩号 K0+503.967, 道路全长 503.967m, 红线宽度 30m, 双向 4 车道, 车行道宽 11m, 人行道宽 4m, 设计时速 40km/h。

2. 横九路: 起点桩号 K0+000, 终点桩号 K0+401.612, 道路全长 401.612m, 红线宽度 16m, 双向 2 车道, 车行道宽 5m, 人行道宽 3m, 设计时速 30km/h。

3. 环湖四路: 起点桩号 K0+000, 终点桩号 K0+279.52, 道路全长 279.52m, 红线宽度 12m, 双向 2 车道, 车行道宽 3.5m, 人行道宽 2.5m, 道路设计时速 30km/h。

(三) 项目地点: 广安市神龙山组团内。

(四) 工作内容: 完成本项目照明工程专业分包施工图设计文件、图纸变更及工程量清单(报价表)所示范围内的全部施工内容。

(五) 施工工期：计划施工总工期 120 个日历天。计划开工日期为

2022 年 12 月 1 日，计划竣工日期为 2023 年 1 月 31 日。具体施工进度计划详见附件《施工进度计划表》。

二、工程质量及技术要求：符合国家现行相关标准、行业相关规范及本项目照明工程专业分包施工图设计文件要求。

三、检测标准

(一) 长度允许偏差为杆长的 $\pm 0.5\%$ ；

(二) 杆身直线度允许误差小于 3‰；

(三) 杆身横截面直径、对角线或对边距允许偏差为 $\pm 1\%$ 。

甲方通知为准)。

二、工程质量及技术要求：符合国家现行相关标准、行业相关规范及本项目照明工程专业分包施工图设计文件要求。

三、检测标准

- (一) 长度允许偏差为杆长的 $\pm 0.5\%$ ；
- (二) 杆身直线度允许误差小于 3‰；
- (三) 杆身横截面直径、对角线或对边距允许偏差为 $\pm 1\%$ 。

(四) 收灯基础 由力由继 配由箱笔算今国家现行验收规范

装卸费 运输费 施工现场范围内由材料站至工地上车费 安装费 油漆费

损耗费、水费、电费、食宿费、交通费、保险费、利润、管理费、税费（税率为9%）、规费、措施费、质保、维修、检测、验收等完成本项目照明工程专业分包施工工程量清单（报价表）及图纸所示范围内的全部施工内容所需的一切费用。


2.安全文明施工费（¥2476.90元）为固定费用。本合同履行期间，若乙方按甲方要求做好安全文明施工措施，在完成本合同约定的全部施工内容后15个日历天内，甲方应一次性支付安全文明施工费；若因乙方原因造成合同解除，则安全文明施工费根据甲方验收合格的实际工程量的70%计算工程款后，再按1%费率计算，即：安全文明施工费=验收合格的实际工程量×70%×相应单项子目综合单价×1%，但最高不得超过¥2476.90元。

3.本合同不因物价波动或实际完成的工程量与清单工程量的差异而进行综合单价调整，风险和收益由乙方自行承担。但因不可抗力或国家税收政策发生调整或经甲乙双方协商一致的价格调整除外。

（三）支付进度：各单个工程分别按月进行支付。甲乙双方每月办完结算，乙方提供甲方认可的增值税专用发票（税率为9%，若遇国家税收政策调整按照调整后的税率开具，合同价作相应调整），后15个日

工程竣工验收合格之日起计算（若国家有高于前述期限规定的，按国家相关规定执行）。

（二）质保期内，乙方应有专人负责本项目照明工程的保修工作。若乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。质保期内出现质量问题，

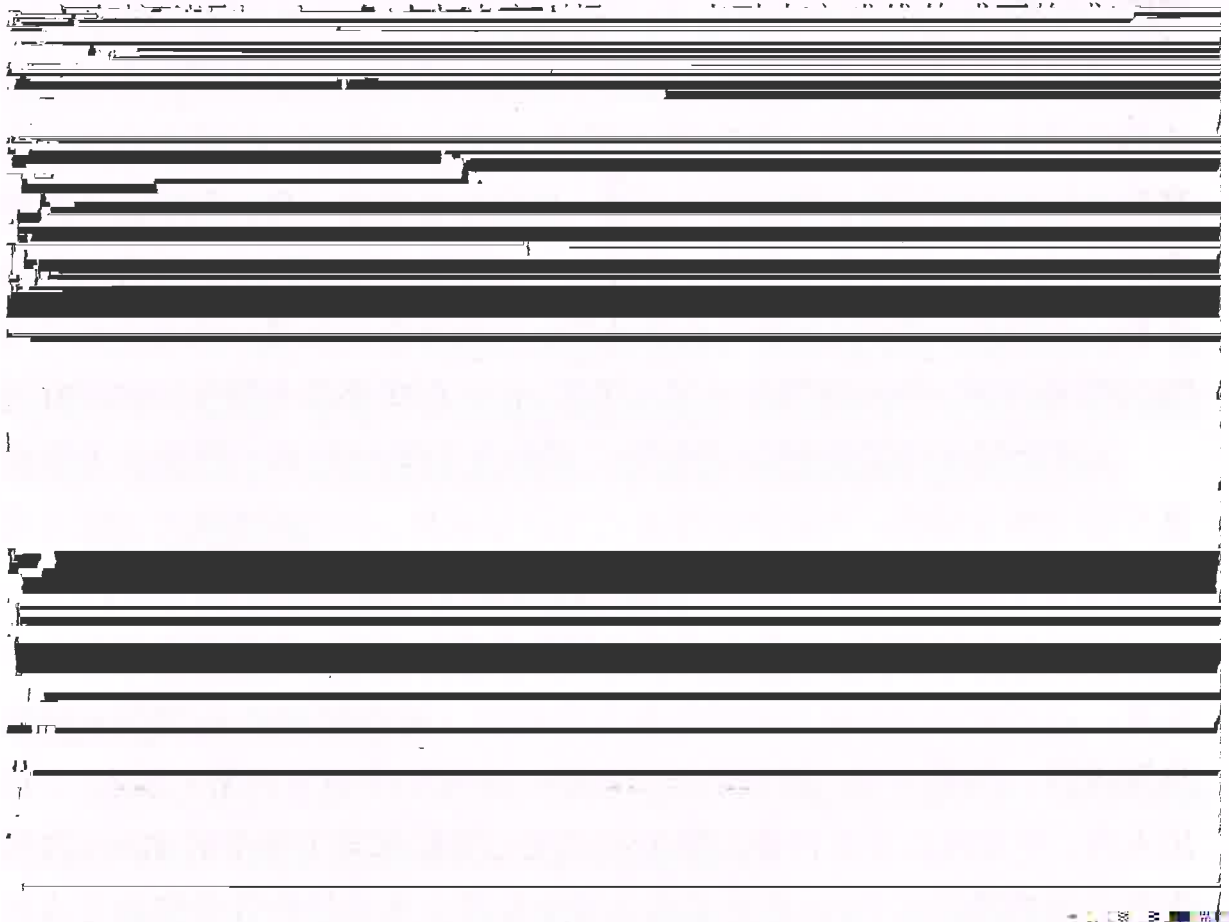

施划。所使用的材料必须符合或优于国家及行业现行标准、本合同约定的质量及其他要求。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，但其产生的所有费用并加收本次保修

合甲方委托的第三方造价咨询单位出具的材料控制价，由乙方组价后，报甲方审核确定为综合单价。

(二) 分部分项工程量清单综合单价中“项目特征描述及施工工作内容”以报价时工程量清单(报价表)、施工图和国家有关规范为准，若工程量清单项目特征描述与施工图和国家有关规范相矛盾，以完成施工图内容和执行国家有关规范为准，结算时不能因报价中工程量清单综合报价“项目特征描述及施工工作内容”描述不充分而进行综合单价调整。

(三) 甲方根据设计变更等实际情况，有权对本项目工程量清单中的内容进行调整，乙方应严格执行，相应变更原则按上述执行。若甲方取消任何一项工作，则该工作不予计量支付，且不赔偿乙方任何损失。

(四) 未经甲方许可，乙方不得对本项目工程量清单中的内容进行调整，若因乙方擅自调整或不按图施工，甲方有权不予计量，且造成的损失概由乙方承担。

(五) 变更程序

1. 乙方提出变更意见，需向甲方提交工程变更申请表，甲方初步确定后1-2个工作日内组织相关部门和乙方现场踏勘确认后形成工程变更现场踏勘纪录，并完成工程变更申请表审签。若甲方未同意的不得实施变更；同意变更的由乙方整理相关变更审批资料(工程变更立项现场纪要、变更图纸、工程量清单、变更费用等)，并按照甲方内控变更程序进行审批后实施。

现场有关问题。

6.应安排专人联系乙方，切实加强安全、质量、工期等监督检查，协助乙方办理施工签证、资料整理、验收准备、费用结算等手续，及时解决施工过程中产生的质量问题，为乙方创造良好施工环境。

7.若有工程变更，甲方应提前以书面形式通知乙方，并及时签订补充协议，并据实办理施工签证。

8.按本合同约定支付工程款。

(二) 乙方责任与义务

1.乙方在进场施工 5 日内应按规定为其员工（包括农民工）购买保险，并承担相关费用。若发生保险事故，甲乙双方应配合做好理赔等善后工作。若因乙方措施不力，致使损失扩大或理赔延误或失去保险理赔，则由乙方承担相应责任。

2.乙方在进场施工前，应按规定与其员工（包括农民工）签订劳动合同。严格管理员工（包括农民工），不得有损害甲方声誉、形象的言行。

3.乙方应在每月 5 日前按甲方要求将支付农民工工资相关有效资料（包括但不限于农民工实名制花名册、农民工考勤表、考勤汇总表、工资支付表、工资卡复印件、身份证复印等资料）报甲方。

4.乙方应按时足额向其雇佣的人员支付工资及其他费用，如有拖欠，甲方有权截留应支付给乙方的工程款，并代为向雇佣人员支付。

5.乙方应严格遵守国家法律法规和政策规定，认真履行安全生产义务，

供样品，进场材料须与样品一致，且必须是合格产品，并符合设计及相关

[REDACTED]

标准。未经甲方确认同意或不合格的设备、主要材料，甲方有权要求乙方无条件更换，由此产生的费用及损失由乙方承担，由此造成的工期延误责任由乙方承担。即便乙方提供的设备、主要材料经甲方同意使用，但仍要

合并适用。

(二) 甲方应按本合同约定的时间向乙方支付工程款。若甲方逾期未支付的,甲方就应付而未付部分按一年期贷款市场报价利率支付利息。因乙方原因造成逾期付款的,甲方不承担违约责任。

(三) 在本合同履行期间,若乙方对工程进行分包或转包的,视为乙方违约,甲方有权单方面解除本合同。同时乙方还须承担¥20000.00元违约金,并承担由此给甲方造成的一切相关经济损失。对乙方已完工程量经甲方验收合格后按70%结算工程款,并禁止乙方近3年内参与甲方任何形式的采购活动。

(四) 若乙方未按合同约定达到工程施工安全、质量、进度等要求,

[REDACTED]



(五) 因乙方原因造成合同解除的, 已履行的部分工作经甲方验收合格后按 70% 结算工程款; 因甲方原因造成合同解除的, 尚未履行的不再履行且不支付任何费用。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失, 并按照相关条款的约定承担违约责任。合同解除后, 乙方应当在 3 个日历天内撤离施工现场, 如不按时撤场, 则向甲方支付¥1000.00 元/日的违约金, 违约金按日历天累计计算。

十二、争议的解决

本合同履行期间发生的争议, 双方应尽量协商解决, 若协商不成, 任何一方均应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十三、合同生效及其他

(一) 本合同未尽事宜, 经双方协商一致形成补充协议, 补充协议与本合同具有同等法律效力。

(二) 本合同一式叁份, 甲方执贰份, 乙方执壹份, 自双方签名并盖章之日起生效, 均具有同等的法律效力。

(三) 本合同有效期内, 合同所载双方的名称、联系人及地址是合同所涉各种文书及诉讼时法院文书送达接收人及地址, 若发生变化而未书面通知对方, 一方按本合同所载地址向另一方发送的所有文书, 视同送达。

十四、合同附件

(一) 工程质量保修书。

(二) 廉政合同。

(三) 安全环保文明施工管理协议书。

(四) 乙方填报的《神龙山组团市政建设工程——神龙西路等 3 条道路照明工程专业分包施工工程量清单 (报价表)》。
